


Huhkolan liikuntapuisto

Teuvo Munkki

Nuoriso- ja liikuntatoimenjohtaja

24.9.2020 Naantali

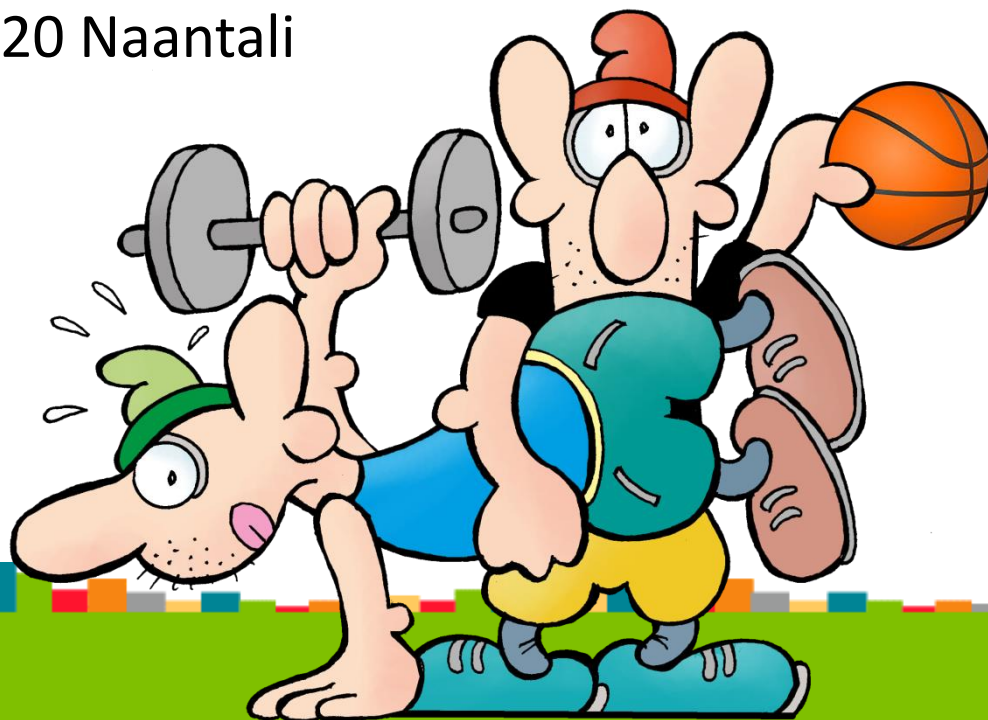

HUITTISTEN KAUPUNKI

Miten hankkeeseen on päädytty

- Huittisten kaupungin strategian 2017 – 2025 keskeisenä painopistealueena ovat hyvinvoivat ja aktiiviset asukkaat.
- Kaupungin hyvinvointisuunnitelmassa on asetettu tavoitteeksi liikunnan lisääminen ja passiivisuuden vähentäminen sekä aktiivisuuden ja omatoimisuuden mahdollistavien lähiympäristöjen toteuttaminen.
- Toimenpiteinä tämä tarkoittaa mm. laadukkaiden ja monipuolisten liikuntapaikkojen rakentamista kaupunkiin.

Esisuunnittelun lähtökohta

- Esisuunnittelun lähtökohtana oli tehdä monipuolinen kaikenikäisille suunnattu liikuntapuisto keskeiselle liikuntapaikalle Huittisiin.
- Suunnitelmassa otettiin huomioon eri-ikäiset käyttäjät: päiväkotilapset, koululaiset, lapsiperheet, kuntoilevat aikuiset, ikäihmiset ja liikuntaesteiset (liikuntarajoitteiset).

Liikuntapuistoalueen valinta

- Alueelle rakennettiin Huittisten uutta liikuntahallia
- Alueella ennestään Huittisten keskusurheilukenttä ja uimahalli. Tähän kokonaisuuteen kuuluvat myös hiekkatekonurminen tenniskenttä sekä nurmipohjainen jalkapallokenttä.
- Maisemaa halkoo Punkalaitumenjoki, jonka toisella puolella sijaitsevat yksityinen jäähalli ja liikuntakeskus sekä paikallisen urheiluseuran talkoilla kunnostama tekonurmikenttä.
- Alueella on kesäisin käytössä beachvolleykenttä sekä asfalttipohjainen tenniskenttä, joka toimii talvisin jääkiekkokaukalona.
- Beachvolleykentän lähiympäristössä on pelialue, jossa on mahdollista pelata mm. petanqueta ja kyykkää. Tämä alue jäädytetään talvisin yleisöluistelua varten.
- Esteetön 18 -väyläinen frisbeegolfrata kiertää koko puistomaista liikunta-alueetta.

Liikuntapuistoalueen valinta

- Tämän alueen välittömässä läheisyydessä, joista on esteetön kulku monipuoliseen liikuntakokonaisuuteen sijaitsee:
 - Kaksi päiväkotia
 - Huittisten suurin alakoulu
 - Pellonpuiston koulu (yläkoulu)
 - Lauttakylän lukio
 - Palvelukeskus Kaariranta
 - Huhkolankoto (kehitysvammaisten asumispalveluyksikkö)
 - Uimahalli
 - Kirjasto

Hankkeen käynnistäminen


- Huittisten kaupunki pyysi esisuunnitelmia liikuntapuiston toteuttamiseksi vuosina 2018 – 2019 eri välinevalmistajilta.
- Toimitettujen esisuunnitelmien pohjalta nuoriso- ja liikuntapalvelut yhdessä teknisen palvelukeskuksen kanssa laati alustavan ehdotuksen Liikuntapuiston välineistä ja sijoituspaikoista.

Huittisten liikuntapuiston esisuunnitelma ja alustava välinesuunnitelma



HUITTISTEN KAUPUNKI

huittinen.fi

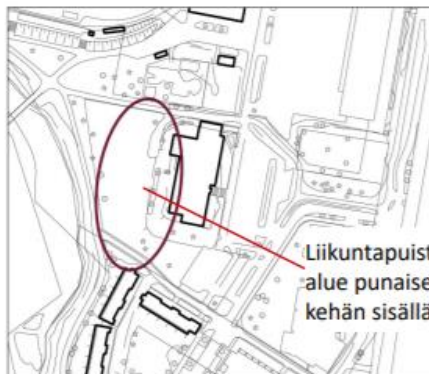

Liikuntapuisto-
alue punaisen
kehän sisällä

Tuotteet

A. Ikäihmisten kuntoilu & oleskelu

1. Senior sport Q10481
2. Selkärangan penkki NF2271, 4 kpl
3. Pöytä NF2291M, 2 kpl

B. Kuntoilupuisto

4. Battling ropes 081255M
5. Dip 'n' fly 081270M
6. Back 'n' abs 081210M
7. Monkey bars 081230M
8. Box M 081201M
9. Box L 081202M
10. Kyttä 081290M

C. Lasten leikkialue

2. Selkärangan penkki NF2271
11. Kilpelyrata Q10676

D. Pumptrack skeitille, pyörille & skootille

12. Pumptrack S 081621

E. Kehonpainoharjoittelualue

13. Leg press 081011M
14. Chest 081005M
15. Back 081006M
16. Sit-up 081004M
17. 081002M Air walker

Hiekkatekonurmi, vihreä (htn,v): 481 m²

Kivituha (kt): 292 m²


Huittisten liikuntapuisto

Huittinen

L10212

Suunnitelmaluonnos, A3/1:350

18.12.2017 / MK

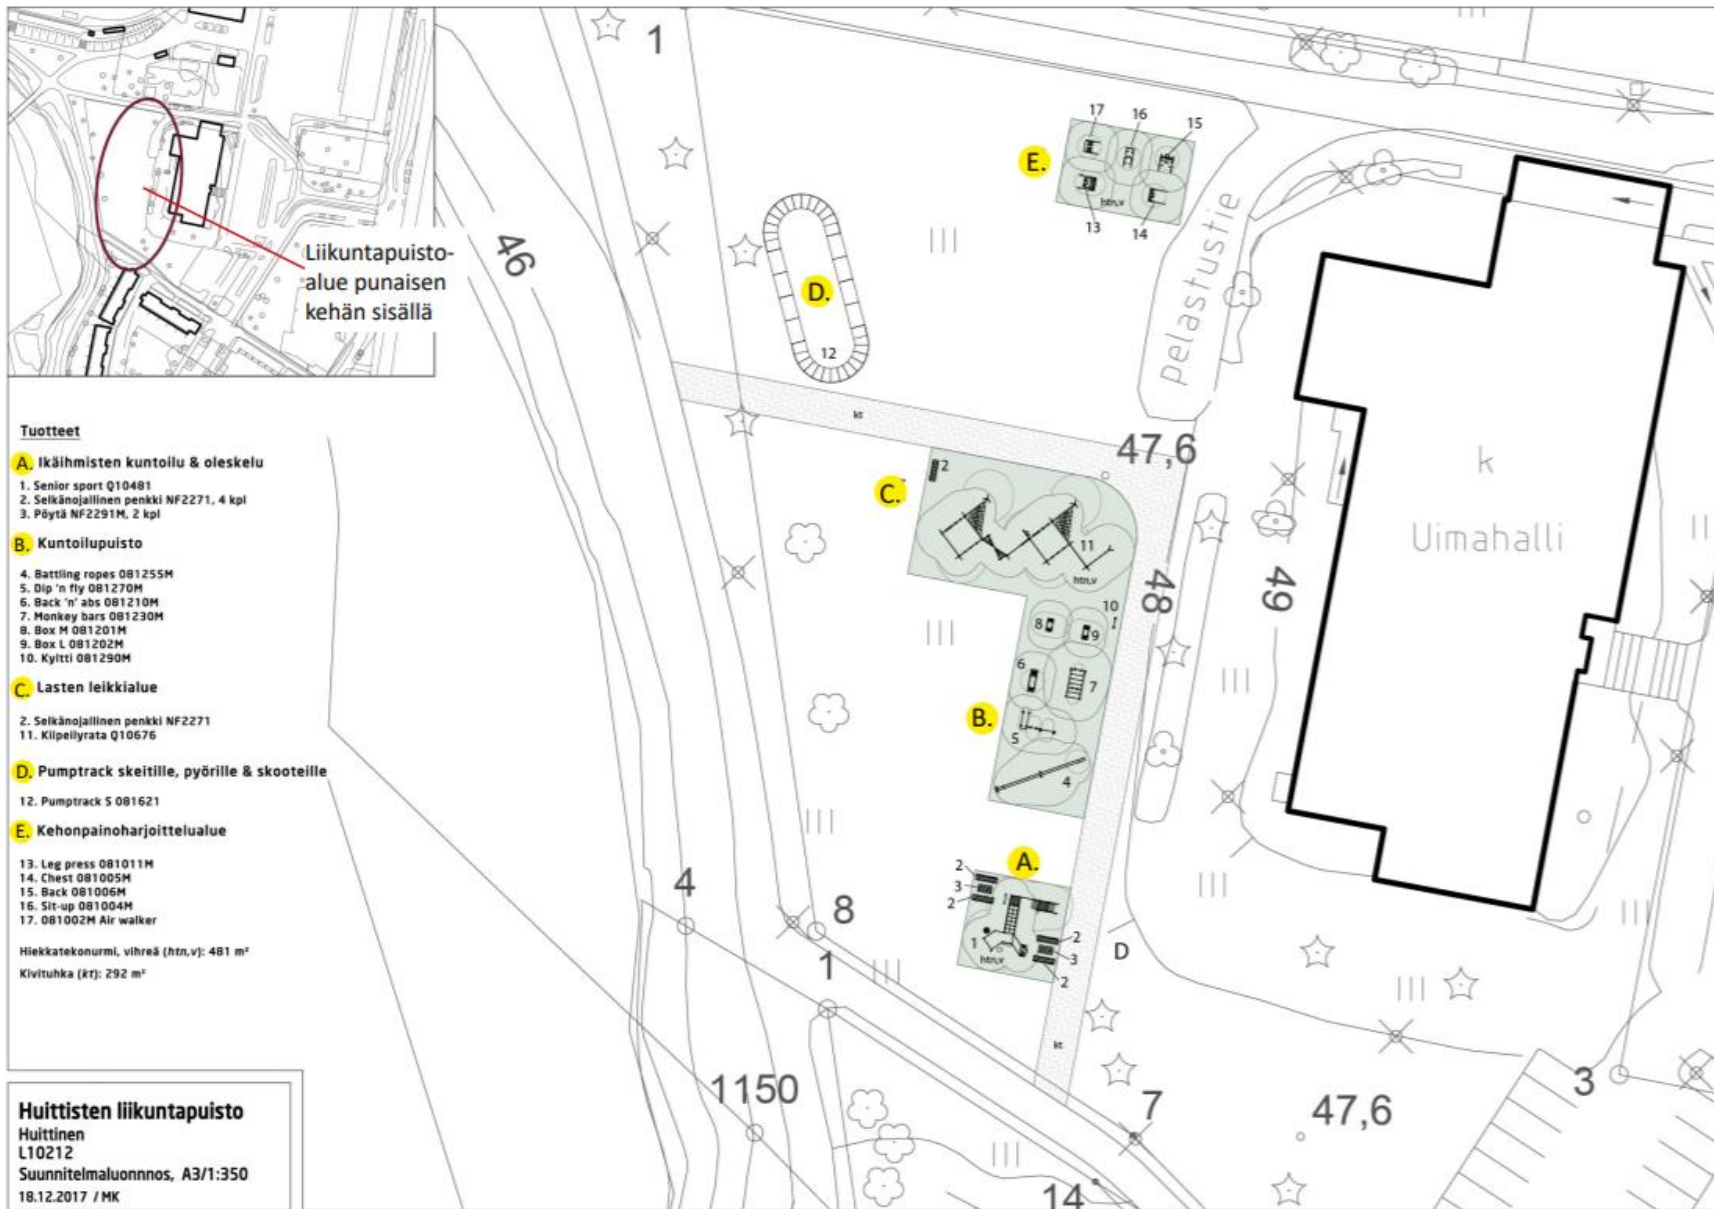

Kuntalaisten kuuleminen

- Nuoriso- ja liikuntapalvelut pyysi lausunnot alustavasta liikuntapuiston suunnitelmaehdotuksesta sivistyslautakunnalta, nuorisovaltuustolta, vanhusneuvostolta, vammaisneuvostolta, Lauttakylän lukiolta, Pellonpuiston yläkoululta, kaikilta alakouluilta, päiväkodeilta ja perhepäivähoidolta.
- Lausuntojen pohjalta huomioitiin laitetoiveita sekä tehtiin muutoksia lopullisessa suunnittelussa mm. eri laitekokonaisuuksien sijoittelussa.

Tiivistetty kuvaus hankkeen rakentamisen aikataulusta

- Liikuntapuiston rakentaminen aloitettiin syyskuussa 2018 ja säiden muututtua talvisiksi rakentaminen pysäytettiin talvikaudeksi. Rakentamista jatkettiin toukokuussa 2019 ja liikuntapuisto saatiin rakenteiden osalta valmiiksi elokuussa 2019. Kaikki viimeistelytyöt ja valaistukset saatiin valmiiksi lokakuussa 2019.
- LOPPUTARKASTUS 18.12.2019

Onnistumiset

- Esisuunnitteluvaiheessa saatiin eri välinevalmistajat hyvin mukaan hankkeen suunnitteluun.
- Saatiin osallistettua eri tahot hyvin antamaan kommentteja ja lausuntoja alustavasta suunnitelmaehdotuksesta.
- Saatiin vietyä hanke loppuun suunnitellusti.
- Säästöpankin mukaantulo hankkeeseen
 - Säästöpankki lahjoitti osana omaa vastuullisuusprojektia liikuntapuiston kuntoilupuisto-osion liikuntavälineisiin 13.500,00 euroa.

Onnistumiset

- Huittisten kaupungin osuus kustannuksista kasvoi noin 10 000 euroa suunnittelusta arviosta, mutta ei aiheuttanut ongelmia.
- Lopulliset kokonaiskustannukset noin 157 000 €
 - AVIN avustus 45 000 €
 - Säästöpankin lahjoitus 13 500 €
 - Huittisten kaupunki 98 500 €



YLÄKOULU

TEKONURMI

TENNISKENTÄT

UUSI KOULU

PUTTIPUISTO

FRISBEEGOLRATA

JÄÄHALLI

SPIRAALI

KAARIRANTA

LIIKUNTAPUISTO

UIMAHALLI

TAHTO AREENA

URHEILUKENTTÄ

KIRJASTO

TALLI - NUORTEN
KULTTUURITILA

LUKIO 200 M

VÄISTÖKOULU

PADELKENTTÄ

PÄIVÄKOTI 2

PÄIVÄKOTI 500

Jatkonäkymät

- Aluetta edelleen kehitetään.
- Syksyn aikana liikuntapuiston lähialueelta Huittisten kaupunki vuokraa maa-alueen yksityiselle palveluntarjoajalle PADEL –kentän rakentamiselle.
- Alueen vuokrauksesta myönteinen päätös tekniseltä lautakunnalta 15.9.2020 asia menee vielä kaupunginhallituksen käsittelyyn.
- Puttiparkki liikuntapuiston lähialueelle vielä syyskuun aikana (Pelillistetty pieni frisbeepuisto 50 x 50 m). Suomessa ensimmäinen.
- Alustavia keskusteluja käyty paikallisen salibandyseuran kanssa SunSäbä -kentän rakentamisesta alueelle.

Kuva Padel- kentästä



KIITOS !



HUITTISTEN KAUPUNKI
